


解体工事概要

木造　平屋建　延床面積77. 76㎡	
屋　根	カラー ベスト 葺き
外　壁	土壁（板張り 、一部トタン 張り ）
基　礎	延石置き 基礎
備　考	附帯施設解体：倉庫

※解体完了後、敷地内整地の 上、防草シート 張りとする

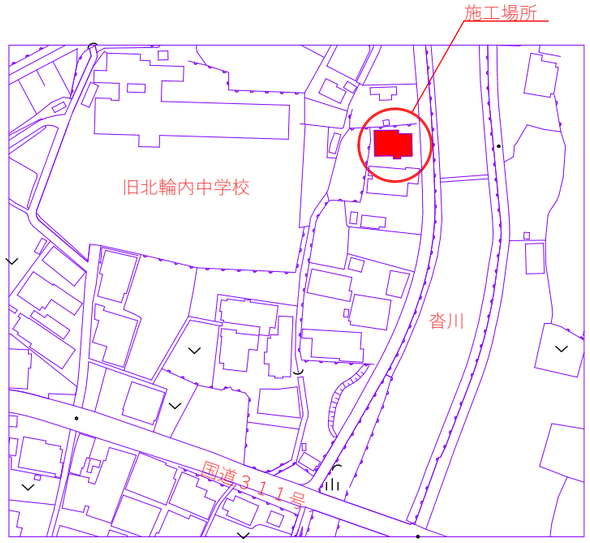

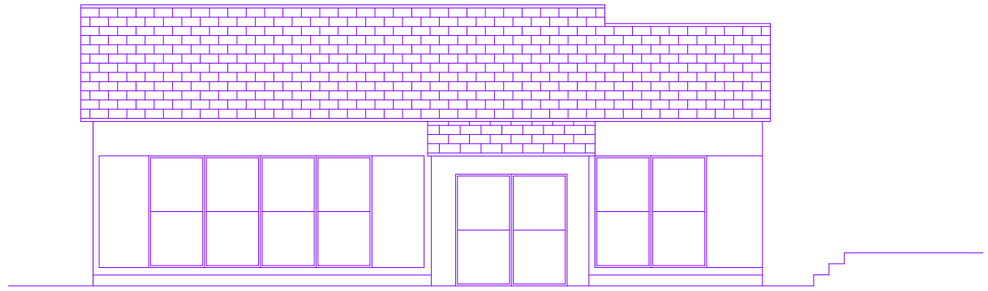

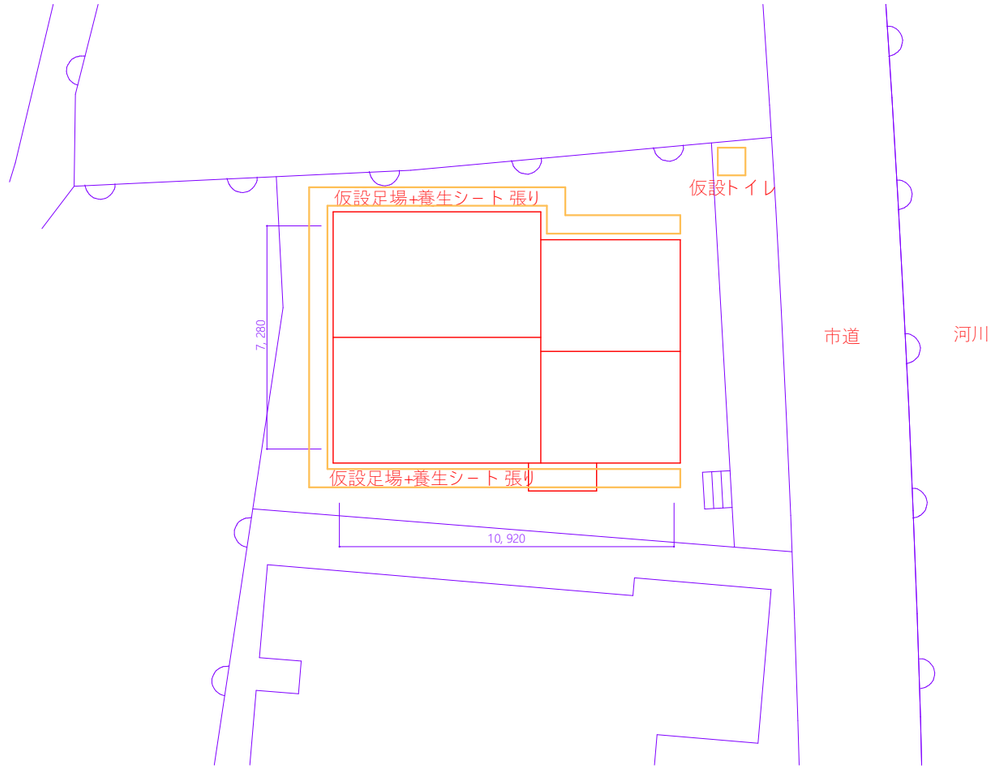

尾鷲市		TITLE 旧北輪内中学校教員住宅解体工事	SUBJECT	NO. 1/1
			DATE R8. 11	SCALE @A3 1/100
